☐ **Anfrage** ☐ **Bestellung**

KÄMPFE
Stahl - und Bewehrungsbau GmbH

Auftraggeber (Stempel | Adresse | Telefon | Telefax):

Bauvorhaben:

Straße:

PLZ / Ort:

Plan:

Bearbeiter / Bauleiter :

Funktel.:

E-Mail:

Prinzipskizze der Körbe ohne und mit Zulagen

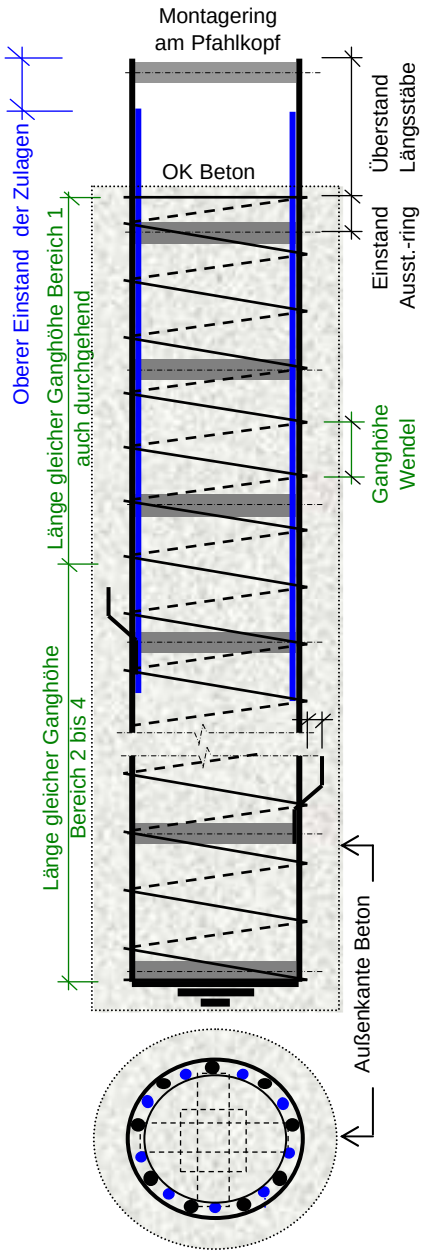

Pfahlposition :						
Anzahl der Körbe :						
Längsstäbe:						
BST 500 S — Anzahl [Stk] :						
Stab - Ø [mm] :						
Länge [cm] :						
Überstand zur Wendel [cm] :						
Einstand Aussteifungsring [cm] :						
Zulagen:						
BST 500 S — Anzahl [Stk] :						
(optional) — Stab - Ø [mm] :						
Länge [cm] :						
Oberer Einstand [cm] :						
Wendel (max.4Bereiche)**:**						
BST 500 WR						
Wendelaußen-Ø oder Korb-Ø [cm] :						
Wendelstab - Ø [mm] :						
Bereich 1 — Ganghöhe [cm] :						
(auch durchgehend!) — Länge [cm] :						
Bereich 2 — Ganghöhe [cm] :						
(optional) — Länge [cm] :						
Bereich 3 — Ganghöhe [cm] :						
(optional) — Länge [cm] :						
Bereich 4 — Ganghöhe [cm] :						
(optional) — Länge [cm] :						
Abstandhalter:						
BST 500 WR						
Abstand zur Außenkante [cm] :						
Fussplatte:						
S 235 JR						
(bitte auswählen und ankreuzen)						
200 x 200 mm :						
oder 300 x 300 mm :						

Alle anderen notwendigen Angaben zu Aussteifungsringen, Abstandhaltern, Fusskreuz, Fussplatte etc. (Anzahl, Abstände, Dimensionierung) werden unter Berücksichtigung der DIN 1045, DIN 4099 sowie ZTV-K durch uns berechnet.

INSTITUT FÜR STAHLBETONBEWEHRUNG E.V. ZERTIFIKAT

Eignungsnachweis zum Betonstahlschweißen nach DIN 4099

KÄMPFE Zulassung BSt 500 WR SLV HALLE
